


EVOLUÇÃO – Conectividade segue em linha com o previsto







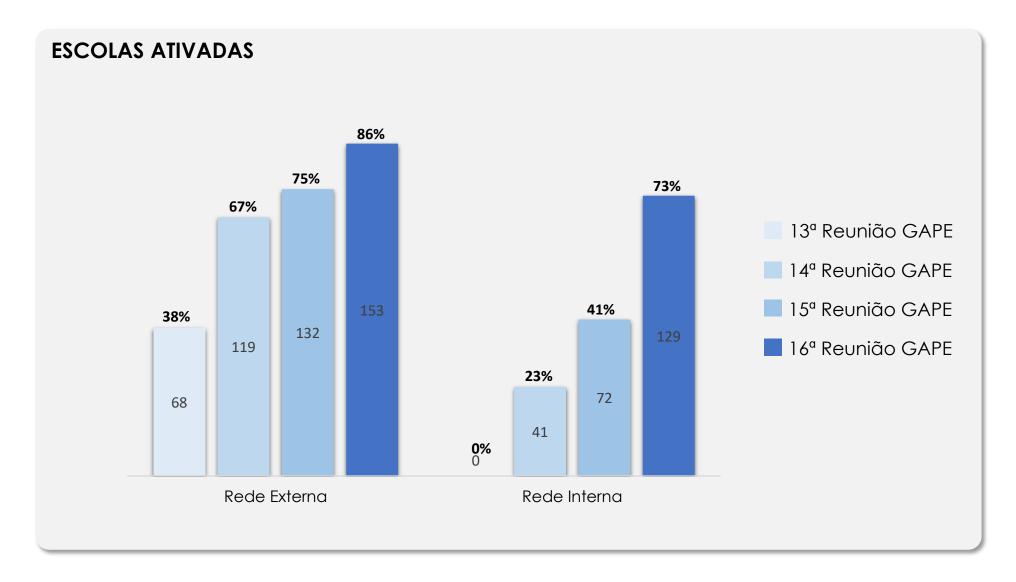





CONECTIVIDADE - Rede Externa (por Município)

153/177 escolas ativadas

		~	
v	_	٠,	
o	o	70	

			Ac	esso - Rede Exte	rna		
Município	Total	Ativadas	Implantação (Projetos Especiais)	Em reforma	Desativada	*Em contratação	% Ativadas
Baía da Traição/PB	17	16		1			94%
Berilo/MG	23	23					100%
Cavalcante/GO	22	14	7		1		64%
Coronel Domingos Soares/PR	15	9	6				60%
Entre Rios/SC	10	10					100%
Espigão D'Oeste/RO	22	21	1				95%
Gaúcha do Norte/MT	15	8				7	53%
Pau D'Arco/PA	11	10		1			91%
Santa Luzia do Itanhy/SE	21	21					100%
Silva Jardim/RJ	21	21					100%
Total	177	153	14	2	1	7	86%

^(*) Aguarda definição pelo GAPE da solução a ser contratada – Impacto no Cronograma



COMPARATIVO - Solução Rádio x Solução Satélite (a negociar)

Velocidade Ofertada e Custo Total - [36 meses]

Código		Velocidade	PROPOST	•	técnica (valores sujeitos a alteração apocidade nominal ofertada (DL/UL - Mb	9 ,	
INEP	Nome da Escola	Necessária* (Mbps)	RÁ	DIO	SATÉLITE		
		(IVIDPS)	Xingu Redes	Evolve Telecom	Global Eagle/Anuvu	Viasat	
51065193	ULUPUWENE	50	50/50	-	60-250/10-30	40/3 (CIR 2%)	
51063590	MEHINAKO MADRIM	50	-	50/25	60-250/10-30	40/3 (CIR 2%)	
51059479	CENTRAL ESTADUAL KARIB	100	-	100/50	60-250/10-30	40/3 (CIR 2%)	
51067811	CENTRAL AIHA	100	-	100/50	60-250/10-30	40/3 (CIR 2%)	
51089343	CENTRAL L. VILLAS BOAS	100	-	100/50	60-250/10-30	40/3 (CIR 2%)	
51059487	MAVUTSININ	50	-	50/25	60-250/10-30	40/3 (CIR 2%)	
51095050	EDUCACAO BASICA PIYULAGA	50	-	50/25	60-250/10-30	40/3 (CIR 2%)	
	Prós		Atendimento pleno das velocidades pretendidas Velocidades mais estáveis Sem franquia de dados		Menor complexidade de manutenção Menor prazo de entrega (45 dias)	 Menor complexidade de manutenção Menor prazo de entrega (30 dias) Sem franquia de dados 	
	Contras		 Manutenção complexa devido a quantidade de enlaces/repetidoras e acessos Maior prazo de entrega (180 dias) Custo de implantação maior (a confirmar após negociação) 		Solução pouco conhecida Variação acentuada nos parâmetros de velocidade Franquia de dados	 Não atende as Velocidades pretendidas Velocidade garantida muito abaixo do pretendido Latência elevada 	
CUST	CUSTO TOTAL [7 escolas] - 36 meses (R\$)		1.078.	600,00	764.970,36 (franquia: 1 TB) 978.788,33 (franquia: 2 TB) 1.895.268,98 (franquia: 6 TB)	465.080,00	



CONECTIVIDADE - Rede Interna (por Município)

129/177 escolas ativadas



	Acesso - Rede Interna							
Município	Total	Ativadas	Em implantação	Projeto	Em reforma	Desativada	% Ativadas	
Baía da Traição/PB	17	16			1		94%	
Berilo/MG	23	23					100%	
Cavalcante/GO	22			21		1		
Coronel Domingos Soares/PR	15	9	6				60%	
Entre Rios/SC	10	10					100%	
Espigão D'Oeste/RO	22	21	1				95%	
Gaúcha do Norte/MT	15			15				
Pau D'Arco/PA	11	10			1		91%	
Santa Luzia do Itanhy/SE	21	21					100%	
Silva Jardim/RJ	21	19			2*		90%	
Total	177	129	7	36	4	1	73%	

^{(*) 2} escolas entraram em reforma



Entidade Administradora da Conectividade de Escolas

PROJETO APRENDER CONECTADO

BERILO - MG
INEP 31023116 - EM DE LAGOINHA

E4CE

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	VISTORIA TÉCNICA	4
3.	REDE EXTERNA	. 10
4.	REDE INTERNA	. 16
5.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	. 29



1. INTRODUÇÃO

A EACE (Entidade Administradora da Conectividade de Escolas), foi constituída para gerir os recursos a ela atribuídos por força do Edital do 5G (Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD ANATEL), tendo como atribuição operacionalizar os procedimentos relativos às atividades relacionadas à consecução de Projetos de Conectividade definidos pelo GAPE (Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas, composto pela Anatel, MEC, MCom e pelas empresas Algar, Claro, Telefônica e Tim), no âmbito das obrigações estabelecidas no referido Edital para as faixas de radiofrequência de 24,3 GHz a 27,5 GHz.

Escopo do projeto:

- Instalação de rede até escola (última milha);
- Prover banda larga com a qualidade e velocidade necessárias para o uso pedagógico;
- Melhorar a infraestrutura interna de distribuição de internet nas escolas (Wi-Fi em todas as áreas das escolas, incluindo pátios, salas multiuso e setor administrativo);
- Implantação de laboratórios móveis de informática (inclui aquisição de equipamentos e de dispositivos compatíveis com a tecnologia para prática pedagógica).



2. VISTORIA TÉCNICA

A vistoria técnica é realizada para um diagnóstico prévio da condição de infraestrutura da escola, bem como levantamento dos dados necessários ao planejamento e definição de recursos (materiais e serviços) a serem mobilizados para o atendimento das premissas do projeto Aprender Conectado.

R	ESUMO
Código INEP	31023116
Escola	EM DE LAGOINHA
Cidade	Berilo
UF	MG
Responsável Escola	Angela Lopes Dias Assis
Tel. de Contato	(33) 99804-7406
Quantidade de alunos por turno	59 (MANHÃ: 25 / TARDE: 34)
Quantidade de ambientes	9
Energia comercial	Sim
Tensão da Rede	110V
Laboratório de informática	SIM
Infraestrutura para laboratório	SIM
Área total (m²)	2.550
Acesso a internet	SIM
Provedor	Inforcenter / (33) 3737-1462
Tecnologia	Rádio
Teste de velocidade DL (Mbps)	3,09
Outros provedores na Região	NÃO
Provedor A / Tecnologia	/
Provedor B / Tecnologia	/
Provedor C / Tecnologia	1
Resp. vistoria	Isac Túlio Ramalho
Data	15/09/2022




	_		1	
_	4	4		
		1	١	

	IDE	NTIFICAÇÃO DA E	SCOLA
CÓDIGO INEP	31023116		QTDE DE ALUNOS POR TURNO [59 [MANHĀ: 25 / TARDE: 34]
ESCOLA	EM DE LAGOINHA		ENDEREÇO COMUNIDADE QUILOMBOLAS DE LAGORNIA S/N
BAIRRO	COMUNIDADE LAGOINHA		CEP 39640000
CIDADE	Berilo		UF[MG]
ENDEREÇO ESTA CORRETO?	S PONTO REFERENCIA Ao L	ado da igreja catolica Santa Ana	
COORDENADAS (LAT/LONG)	-16,71708	42,50077 COORDE	NADAS ESTÃO CORRETAS? 5
ZONA RURAL	X ZONA URBANA		
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	28 Km da cidade Berilo		
RESP. ACOMPANHAMENTO	Angela Lopes Dias Assis	TELEFON	E (33) 99804-7406
DOC. IDENTIFICAÇÃO	129.573.046-43	EMAL	
MEDIDOR DE ENERGIA Nª	S/N TEN	SÃO DA REDE X 110V	220V ESTADO DO QUADRO ENERGIA? DOM
RESP. VISTORIA	Isac Túlio Ramalho	DATA:	15/09/2022
3.4 1000 100	BIJA 28 FERNING MODERTO DE SOJEJA	P.M. ZE OCIA SI A JOSÉ BAGOS E	TENNES MISERTO DE SOUGA FRAÇA OSA OSA OSA OSA OSA OSA OSA





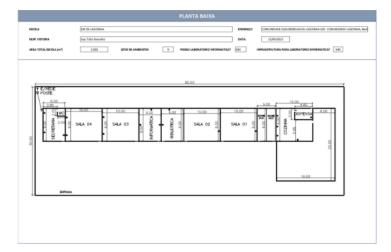






				EQL	JIPAME	NTOS			
HEOLA	EM DE LA GOMMA					виовянсо	COMUNICADE QUALDRISO	LAS DE LACORNAL (IN - COMUNIDADE LACORNAL Berlis / MG	
MESP. VISTORIA	ue Tille famalte]	9474	14,64/2022	Ī
LOCAL	MITTAGEM	QTDE	SOLIPAMINTOS.	GT04	anonación:	s r describações			
ANDAR/WA	H-1	1094045	-	-	-				
Sele 1	90	1							
Sele 2	90	1							
Sale S	90	3							
Sele 4	90	2							
Secretaria	54		1 computation e 1 reteator	3					
Sala information	54		Moneyulations of Lealth	11					
Bislatesa	54	2							
								<u> </u>	
									_
								<u> </u>	_


E4CE

3. REDE EXTERNA

Etapa de viabilização da conectividade (acesso à internet) para a escola.

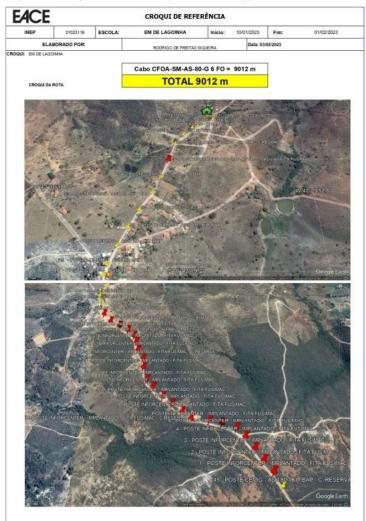



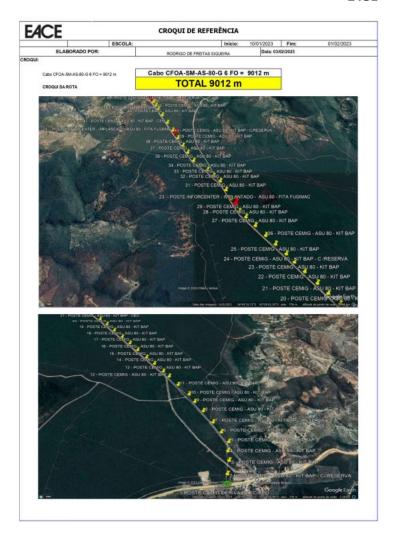

E4CE

Medição de serviços em PROJETOS ESPECIAIS

Empresa Con CNP3: Municipio/Es INEP: Escola:		Inforcenter 05.757.324/0001-92 Berillo - MG 31023116 EM DE LAGOINHA	Responsável Contratada: Documento identificação: Reponsável EACE: Documento identificação:	CPF:039768	reitas Siqueira	Início Execução: Fim Execução: Data aceitação: Fiscal Responsável:	10/01/2021 01/02/2021 03/02/2021 RODRIGO SIQUERA
SERVIÇOS		50.05	Cabo CFOA-SM-AS-80-	G 6 FO = 9012	t m	36 2	
Rem	Classe	Descriçã	io dos serviços executados	Unidade	Quantidade Real	Medição	Saldo à Executar
1	L	Construção de Rede de A equipamentos)	cesso em fibra óptica (serviços, materiais e	TOTAL 1969m	9012,000	Final	0,00
2	L	Implantação de Postes po (serviços, materiais e equ	ara Rede de Acesso em Fibra Optica ipamentos)	Unidade	25,00	Final	0,00
3	R	Construção de enlace de materiais e equipamento	Radio para Acesso as escolas (serviços, s)	Enlace	0,00	Final	0,00

Item	Classe	Material Aplicado	Unidade	Quantidade Aplicada
1	1	CABO OPTICO CFOA-SM-ASU 80 -5 6 FO	m	9012,00
2	L	CABO OPTICO CFOA-SM-ASU 120 -S 12 FO	m	0,00
1	L	FITA FUSIMEC FUSIMEC	Rolo	4,00
4	L	SUPORTE SCO1-DPR PARA CABO DE FIBRA OPTICA	Unidade	85,00
5	L	CAIXA DE EMENDA OPTICA 16FO C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO	Unidade	3,00
6	1.	POSTE MADEIRA TRATADO 7m	Unidade	25,00
7	L.	PARAFUSO OLHAL	Unidade	0,00
8	t	KIT FITA BAP	Unidade	56,00
9	L	CTO - CAIXA DE TERMINAÇÃO OPTICA	Unidade	3,00

Responsável pela Contratada

Nome: Jose Eustaqui Ferreira de Souza CPF: 3976820695

Cargo: Diretor

Data:

Documento assinado digitalmente

GOV.DY JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA Duta: 10/02/2023 11:59:17-0300 Verifique em https://verificador.isi.by

Responsável EACE

Nome: Rodrigo de Freitas Siqueira CPF: 07961393692


Cargo: Fiscal de Implantação

Data:





EACE

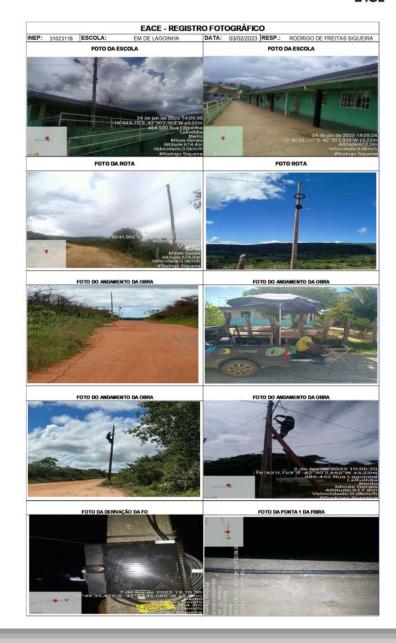





E4CE

TERMO DE ACEITAÇÃO DE CONECTIVIDADE EM ESCOLAS - REDE EXTERNA


Codigo INSP. Nome da Escola: Fipo dependencia (Municipal/Istadual) Localização (flure/(firhene): Muescipia: Responsável (soolas: DADOS DA CORRICTIVIDADE: Provedar: 8		EM DE I MUR RI BE	22116 AAGOINHA UKAL UKAL				
Fiso dependencia (Municipal/Istadua) Laceflanção (Rumi(Chlema)) Municípia: Responsível Escala: Documento de Identificação: DADOS DA CONECTIVIDADE:		MUR Ri	SICIPAL URAL				
Localia ação (flura (flura (flura na): Alvantigae: Associate de la contra de la c		MUR Ri	SICIPAL URAL				
Municipio: Perponsivel Escolas Documento de Identificação: DADOS DA CONECTIVIDADE:		PA 04	URAL URAD				
Responsável Escolaci Documento de Identificação: DADOS DA CORECTIVIDADE:		DE	RILO				
Documento de Identificação; DADOS DA CONECTIVIDADE:							
DADOS DA CONECTIVIDADE:		Angesa Los	Angela Lopes Dias Assis				
	_	129.573.046-43					
Provedor: II		129.57	73.046-43				
	NFORCENTER	Velocidade (download em Mbps):	205MBPS				
Tipo de Conectivade:	MAA	Velocidade (upload em Misps):	203MSPS				
Duta da Athração: 6	2/02/2023	Latencia (ms):	7M5				
Velocidade Contratada: 2	DOMBPS						
Teste 01:	Teste	62:	Equipamento:				
Reg Download Catrol Secretors	S Upbal Sniedno)	20501 20380 *** 61 87 81					
7m 205.0 mm.	2012 nts		No. of the last				
OBSERVAÇÕES:							



4. REDE INTERNA


Etapa de viabilização de rede interna (cobertura Wi-Fi) para a escola.

Estimated 2.4GHz WiFi Coverage

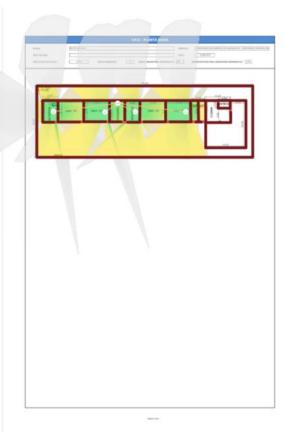

E4CE

Estimated 5GHz WiFi Coverage

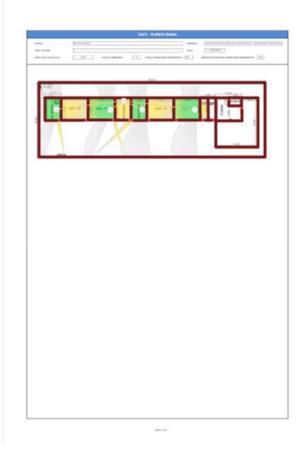






GRUP	O BINÁRIO	EACE Entidade Administradora da Conectividade de Escol
	2 - MEMORIAL I	DESCRITIVO
	CÓDIGO INEP 31025115 MOME DA ESCOLA: EN DE LAGORINA	
IDENTIFICAÇÃO I SITE	ENDEREÇO: COMUNIDADE QUILOMBOLAS DE LAGONHA DO	COMPLEMENTO: C. QUILOMBOLAS
	NÚMERO: SIN	CDADE: Berlie UF: MG
	CSP: 36640-008	LATTRUGE: 4E,76075 LONGITUDE: 42,60063
сомтито во за	TE DATA 30/01/2023 CONTATO NA ESCOLA: Angela Lopes Dies	TELEFONE: [33] 98604.7436
LJ. EVANTAMENTO INCAL	Restands of mash-bare de comugados e sidrodulos para passagan de colos UTP para el- POTODIMÍNICO.	siedimento de 4 noves Accesa Profita conforme croqui apresentado na ASA 5-SELAZORIO
r 3 - STUNÇÎO ATURL	© Listh, intervent rolls and distortulation	
cJ- ecessoades		
STIMATIVA DE QUIPAMENTOS E SERVIÇOS	US-Use-sid LCOMP-web-cit	
r.s. beservaptes	Statisado hargão des lique de gastos e súnemos; Estados de la gasto de la gasto de súnemos; Estaglida de trace radios parede de añoses la, statistigão de redensir à lacedaja e espajamentas,	
an nyués		



800 000


E4CE

	3+0	UESTION.	ÁRIO DE PLANE	JAMENTO DA INSTALAÇÃO				
	CÓDIGO (NEP 25481387 N	OME DA ESO	OLA: EM DE LAGORNA	4				
IDENTIFICAÇÃO DO SITE	ENDEREÇO: CONTUNDADE QUILOMBOLAS DE LA	ONHA		COMPLE	COMPLEMENTO: C. QUILOMBOLAS			
					CDADE Serie UF MG			
	NUMERO: SIN			COAD	CDADE Belle			
	CSP: 35640-000			LATITUDE: -16,71675	LONGITUDE: 42,980	90		
CONTATO DO SITE	DATA 30/04/2023 CONTATO NA ESI	OOLA: Angela	Lopes Dies		TELEFONE: [33] 99804-7498			
	2.1.1 NUMERO DE SALAS DE ASLAS 2.1.2 PAREDES ESPESSAS?		_					
	2.1.3 OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:		-					
Z1. AROUTETURA DA ESCOLA	Construção de paredes em elveraria, forro em geste	o imtelrigo em	algumas salas.					
22-REDE	BASEADO APENAS NO NÚMERO DE USUÁRIOS PI 2.21 ATERRAMENTO EXCLUSIVO EXISTENTE?	NVO		DE DA REDE), QUAL O NUMERO DE APS P	REVISTOS PARA A COBERTURA D	OS SESUINTES COMOD		
2.2- REDE ELÉTRICA E TERRALMENTO			CÓMICIDOS (CAPACIDA V V	DE DA REDEL, QUAL O MUNICIPO DE APS P	REMISTOS PARIA A COMERTURA D	OS SESUNTES COMOD		

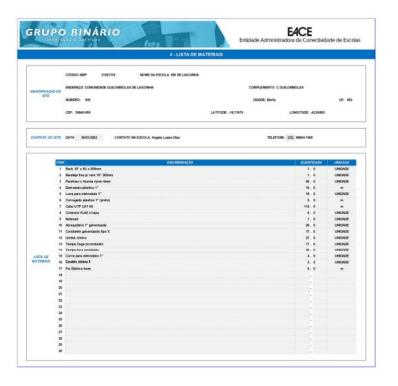





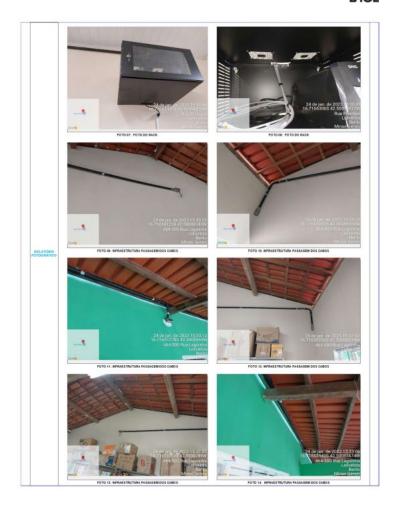





Código INEP: Nome da Escola: Municipio: Responsável Escola:: Documento de identificação: Nome da Empresa: Técnico Responsável:	EM D ANGELA L 125 DADOS EMPRESA REDE INTERNA	1023116 E LAGOINHA BERILO OPES DIAS ASSIS 187304643		
Viunicípio: Responsável Escola:: Documento de identificação: Nome da Empresa:	ANGELA I 125 DADOS EMPRESA REDE INTERNA	BERILO .OPES DIAS ASSIS 257304643		
Responsável Escola:: Documento de identificação: Nome da Empresa:	ANGELA L 129 DADOS EMPRESA REDE INTERNA	OPES DIAS ASSIS 957304643		
Oocumento de Identificação: Nome da Empresa:	DADOS EMPRESA REDE INTERNA	357304643		
Nome da Empresa:	DADOS EMPRESA REDE INTERNA			
	RI			
		EDUTECH		
		PAULO		
тесно незронявуел	REDE WIFI	TAGLO .		
	V100771000			
Rede Visitantes:	Senha: Liberada [CHECK IN)			
Rede Académico:	Senha: AcaPass177			
Rede Administrativo:	Senha: AdmPass177			
EQUIPAMENTOS	SERIAL	LOCAL INSTALADO		
Rack Indoor 5U		SALA DE INFORMATICA		
Switch PoE				
Firewall (UDM)	602232A27 D09	SALA DE INFORMATICA		
Nobreak	272980112816	SALA DE INFORMATICA		
AP 1	60223247BF04	DIRETORIA		
AP 2	60223247AABC	SALA 2		
AP 3	60223247BF58	BIBLIOTECA		
AP 4	60223247BFC8	SALA 4		
AP 5				
AP 6				
AP 7				
AP 8				
AP 9				
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
Foto 1: Rack Aberto	Foto 2: Foto do AP mais distante	Foto 3: Teste velocidade AP mais distante do ra		





5. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Etapa de fornecimento de equipamentos de informática para a escola.

EACE T	ERMO DE ENTREGA	DE EQ	UIPAN	1ENTOS	5	
NOME DA ESCOLA			COD	INEP		
MUNICIPIO			ι	JF		
RESPONSAVEL			DOC IDEN	TIFICAÇÃO		
Notebook Notebook Educacio Projetor Tela de Projeção	gues para uso educacional da es mal dação e Recarga - <mark>Tipo I (1</mark> Proje					
EQUIPAMENTO	SERIAL EQUIPAMENTO		MENTO	SERIAL		
	^{⟨o} zo	[⟨] 9 ₀				
FO1	TO NOTEBOOK			FOTO KIT		
Assinatura Responsá	vel Escola:			Dat:	a: 00/00/2023	
Assinatura Responsá	vel EACE:			Jak	55, 60, 2025	

ROLLOUT – Vistorias (parcial)

UF Município	Qtde Escolas	Qtde Matrículas	Vistorias realizadas	%	Com Energia (Rede Pública)	Sem Internet	Com Internet velocidade insuficiente*	Com Internet velocidade suficiente*	Com Cobertura Wi-Fi adequada*
AM	967	525.941	262	-	-	-	-	-	
Manaus	746	485.546	219	29%	100%	1%	92%	7%	0%
Manicoré**	161	16.469	16	10%	100%	0%	100%	0%	0%
Tabatinga**	60	23.926	27	45%	100%	60%	40%	0%	0%
PA	1.059	180.365	306	-	-	-	-	-	
Afuá**	92	14.068	1	1%	100%	0%	100%	0%	0%
Breves**	262	38.633	34	13%	100%	14%	86%	0%	0%
Portel**	167	21.928	35	21%	96%	23%	77%	0%	0%
Porto de Moz**	99	7.720	52	53%	69%	50%	50%	0%	0%
Santarém	439	88.016	184	42%	100%	1%	64%	35%	0%
РВ	297	117.115	128	-	-	-	-	-	
João Pessoa	297	117.115	128	43%	100%	1%	41%	57%	0%
TOTAL	2.323	823.421	696	30%	98%	9%	70%	21%	0%

^(*) Referência estabelecida pela Portaria Anatel № 2347

^(**) Sede do município não dispõe de backhaul por Fibra

Obrigado!
