

A network graphic consisting of numerous white nodes connected by thin white lines, forming a complex web that fills the background. The nodes are of varying sizes and are distributed across the entire frame. The background has a gradient from light blue on the left to dark blue on the right.

**EACE**

**PROJETO PILOTO**


15ª Reunião Ordinária do GAPE

14/02/2023



Diretoria de Operações

Fevereiro de 2023

# EVOLUÇÃO – Conectividade segue em linha com o previsto

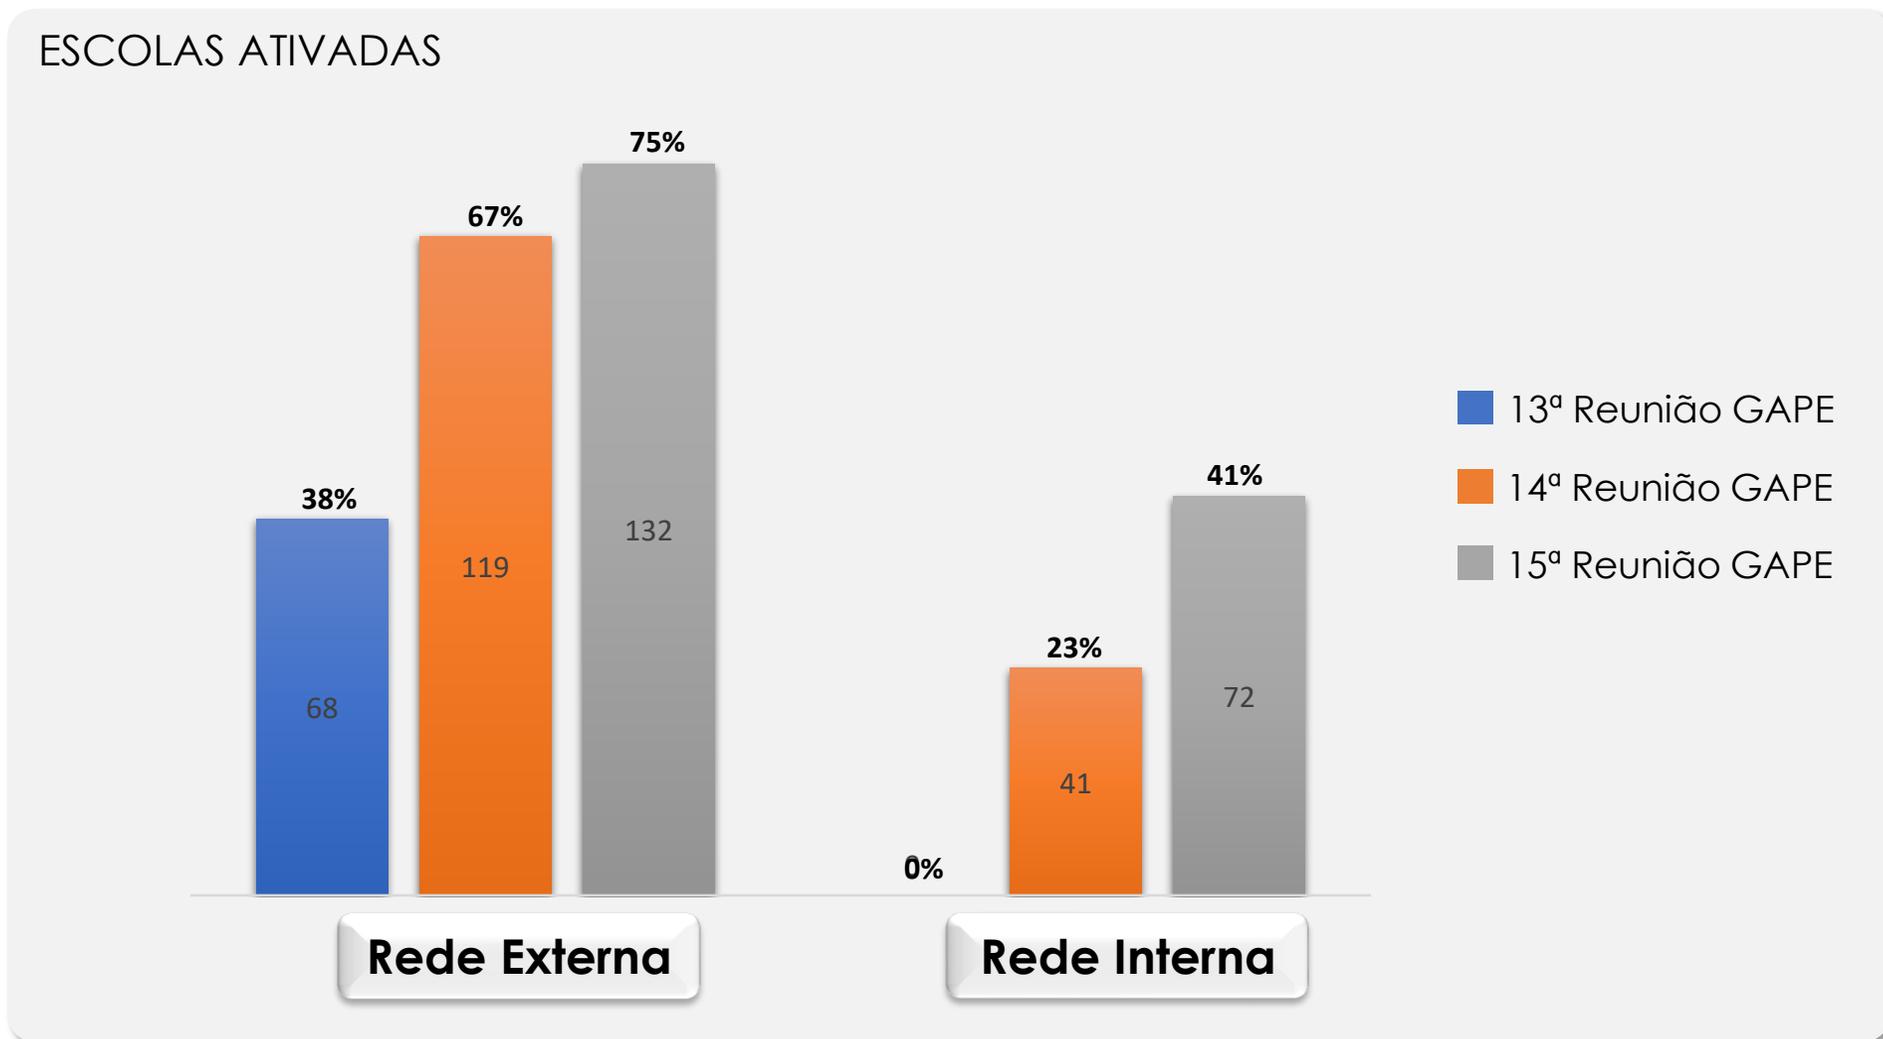

# CONECTIVIDADE - Rede Externa

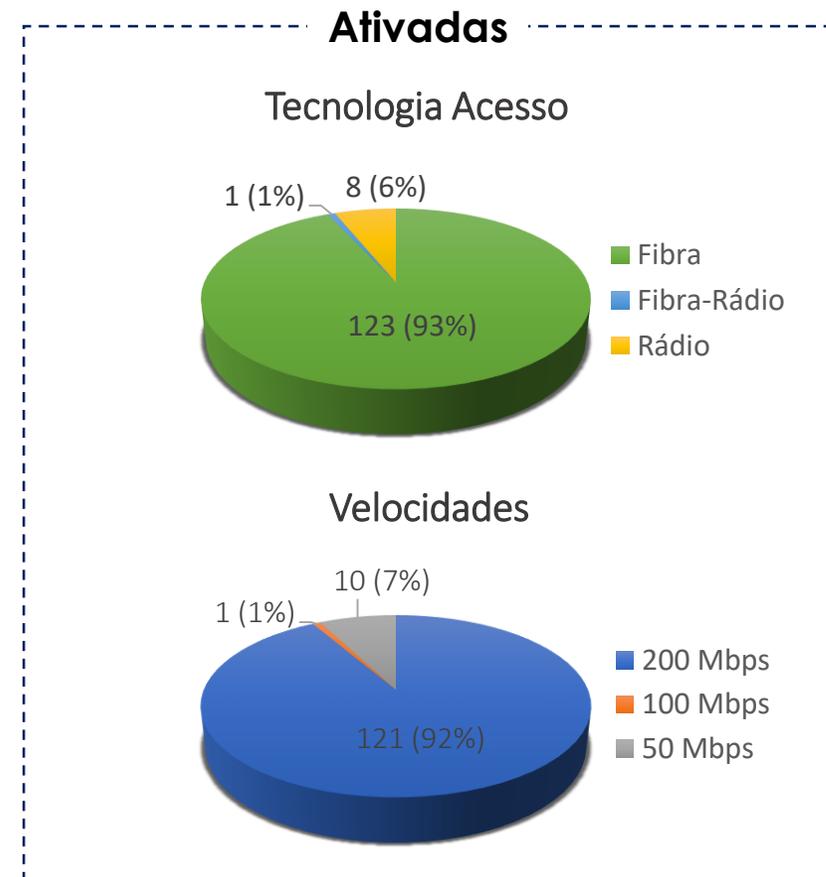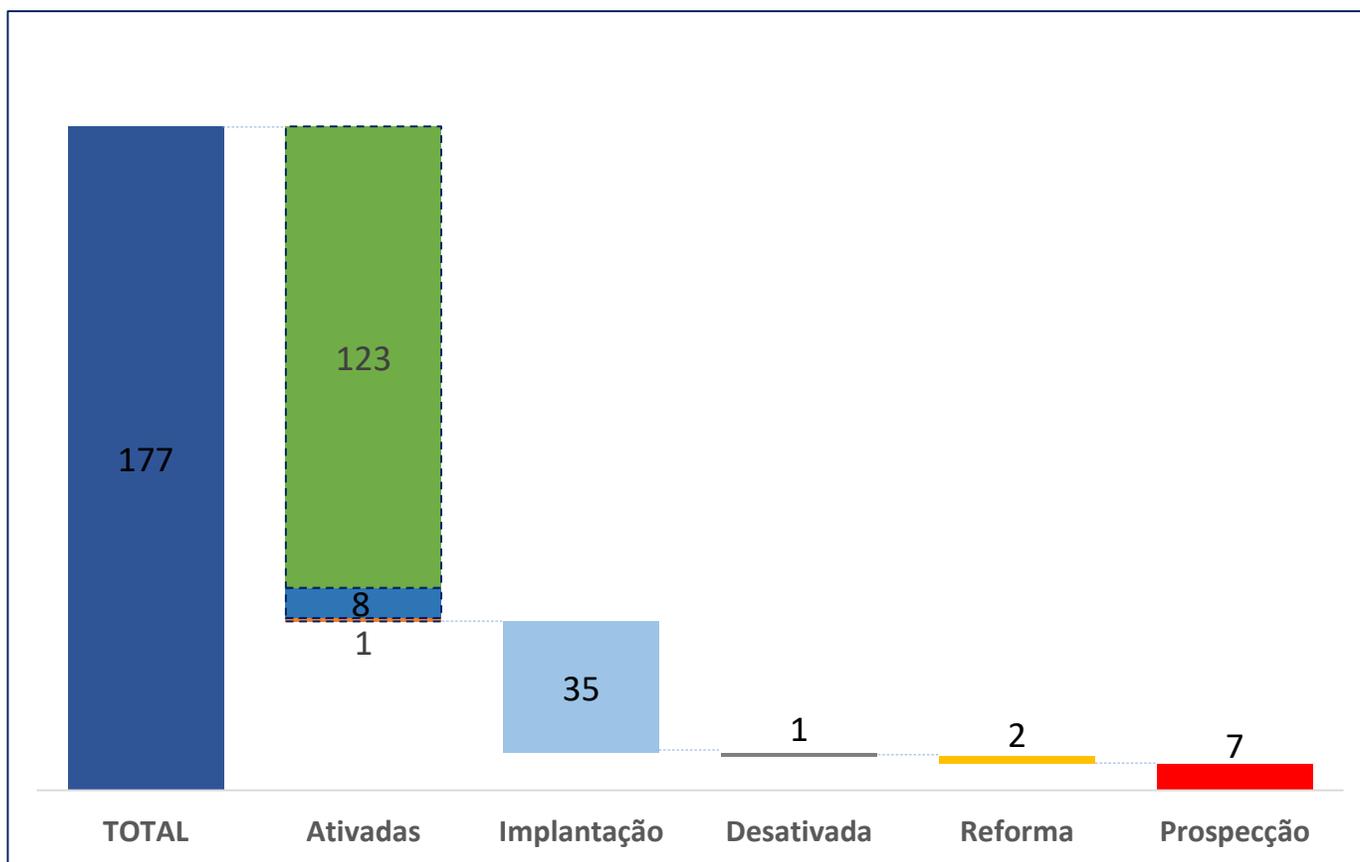

- ❖ 132 (75%) escolas com acesso concluído/ativado, 35 (20%) em implantação (projetos especiais)
- ❖ 1 escola desativada pela Secretaria Municipal de Educação em Cavalcante/GO (52013189 – ESC MUL TERRA VERMELHA, Ofício nº24/2023)
- ❖ 7 (4%) escolas em prospecção de fornecedor em Gaúcha do Norte/MT (escolas em Terra Indígena – Parque do Xingú)

# CONECTIVIDADE - Rede Externa (por Município)


❖ 132/177 escolas ativadas



Município	Acesso - Rede Externa						
	Total	Ativadas	Implantação (Projetos Especiais)	Em reforma	Desativada	Prospecção	% Ativadas
Baía da Traição/PB	17	16		1			94%
Berilo/MG	23	19	4				82%
Cavalcante/GO	22	8	13		1		36%
Coronel Domingos Soares/PR	15	3	12				20%
Entre Rios/SC	10	10					100%
Espigão D'Oeste/RO	22	17	5				77%
Gaúcha do Norte/MT	15	8				7	53%
Pau D'Arco/PA	11	10		1			91%
Santa Luzia do Itanhy/SE	21	21					100%
Silva Jardim/RJ	21	20	1				95%
<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>132</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>75%</b>

# Escolas de Gaúcha do Norte/MT

Código INEP	Nome da Escola	Localização	Distância Sede (km)	Status	Matrículas	Velocidade (DL/UL - Mbps)
51018268	BEM ME QUER	Urbana	N/A	Ativado	498	200/100
51057166	GERVASIO DOS SANTOS COSTA	Urbana	N/A	Ativado	551	200/100
51063581	SONHO MEU PREC DE VOCE APAE	Urbana	N/A	Ativado	33	200/100
51089971	CANTINHO DO AMOR	Urbana	N/A	Ativado	371	200/100
51018241	XINGU	Rural	52	Ativado	45	200/100
51087189	EDUCACAO BASICA BOTUVERA	Rural	342	Ativado	102	200/100
51201810	MIRASSOL	Indígena	25	Ativado	47	50/25
51059460	EMKIA	Indígena	93	Ativado	50	50/25
51065193	ULUPUWENE	Indígena	145	Prospecção	43	
51063590	MEHINAKO MADRIM	Indígena	140	Prospecção	48	
51059479	CENTRAL ESTADUAL KARIB	Indígena	170	Prospecção	390	
51067811	CENTRAL AIHA	Indígena	195	Prospecção	347	
51089343	CENTRAL L. VILLAS BOAS	Indígena	200	Prospecção	464	
51059487	MAVUTSININ	Indígena	210	Prospecção	111	
51095050	EDUCACAO BASICA PIYULAGA	Indígena	220	Prospecção	185	

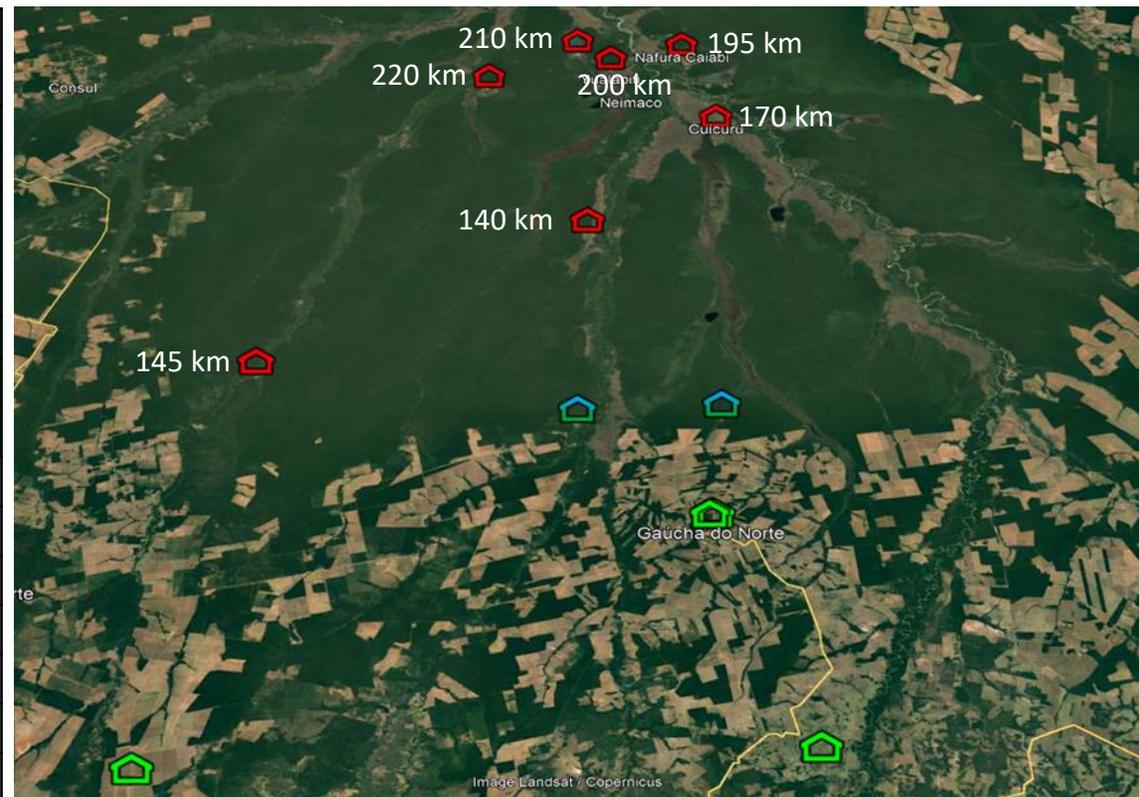

Distâncias por rota terrestre

- ❖ 8 (53%) escolas Ativadas (6 com velocidade 200 Mbps, 2 com velocidade 50Mbps)
- ❖ 7 (47%) escolas em Prospecção
  - 1 proposta de solução via rádio recebida para 6 escolas (Proponente: Evolve) – em avaliação técnica
  - 4 propostas de solução via satélite (RFP de Conectividade Via Satélite) recebidas para 7 escolas (Proponentes: RW Telecom, Global Eagle/Anuvu, Sencinet e ViaSat), 1 proposta para 1 de 7 escolas (Proponente: Telespazio) – em avaliação técnica

# CONECTIVIDADE - Rede Interna (por Município)

❖ 72/177 escolas ativadas



Município	Acesso - Rede Interna							
	Total	Ativadas	Infraestrutura Concluída	Infraestrutura Andamento	Projeto	Em reforma	Desativada	% Ativadas
Baía da Traição/PB	17	14	2			1		82%
Berilo/MG	23	19	4					83%
Cavalcante/GO	22				21		1	
Coronel Domingos Soares/PR	15				15			
Entre Rios/SC	10				10			
Espigão D'Oeste/RO	22				22			
Gaúcha do Norte/MT	15				15			
Pau D'Arco/PA	11				10	1		
Santa Luzia do Itanhy/SE	21	21						100%
Silva Jardim/RJ	21	18		1		2*		86%
<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>41%</b>

(\*) 2 escolas entraram em reforma

**Obrigado!**
