



EACE

PROJETO PILOTO


12ª Reunião Ordinária do GAPE

28/11/2022

Acompanhamento

Atividade	Descrição	Início	Fim (Previsão)	Observações
Visitas aos municípios (EACE)	Visitas realizadas pelo time EACE aos municípios do projeto piloto (Silva Jardim/RJ, Berilo/MG, Santa Luzia do Itanhy/SE, Pau D'arco/PA, Baía da Traição/PB, Cavalcante/GO, Coronel Domingos Soares/SC e Entre Rios/SC).	18/08/22	30/09/22	Atividade Concluída
Vistoria Técnica de Rede Interna	100% das escolas vistoriadas (10 municípios): Silva Jardim/RJ, Berilo/MG, Santa Luzia do Itanhy/SE, Pau D'arco/PA, Baía da Traição/PB, Cavalcante/GO, Coronel Domingos Soares/SC, Espigão do Oeste/RO, Gaúcha do Norte/MT e Entre Rios/SC.	25/08/22	10/10/22	Atividade Concluída
RFP Conectividade	Fornecedores de Rede Externa: Baía da Traição/PB, Berilo/MG, Pau D'Arco/PA: Concluído (em processo de formalização). Cavalcante/GO, Coronel Domingos Soares/PR, Espigão do Oeste/RO, Entre Rios/SC, Gaúcha do Norte/MT, Silva Jardim/RJ e Santa Luzia do Itanhy/SE: Em andamento Fornecedor de Rede Interna (todos os municípios): Concluído (em processo de formalização)	22/08/22	25/11/22	Em Andamento
RFI Conectividade via satélite	Informações sobre disponibilidade para fornecimento de solução de conectividade em abrangência nacional. 8 empresas responderam: StarOne, Hughes, Hispamar, Telespazio, TIWS, Sencinet, ViaSat e Global Eagle.	17/08/22	16/09/22	Atividade Concluída
Equipamentos de Informática	RFI - Informações sobre equipamentos para design do Espaço de Inovação (Lab): 6 empresas responderam (Positivo, Golden, HP, Claro, Arklok e Asuris)	05/09/22	23/09/22	Atividade Concluída
	Visitas de Benchmarking realizadas pelo time EACE: Campina Grande/PB - Projeto Nordeste Conectado/RNP e Sec. Municipal de Educação Cascavel/PR e Toleto/PR - Projeto da Sec. Municipal de Educação.	13/09/22	16/09/22	Atividade Concluída
	RFP e Contratação para fornecimento de Equipamentos de Informática. Modelos de contratação: <i>Hardware as a Service</i> (HaaS) ou Aquisição.	24/10/22	05/12/22	Em Andamento
Rollout do Projeto	Iniciar o 1º lote de vistorias técnicas nas escolas, com capacidade operacional da EACE de 2.400 escolas/semestre.	01/12/22	30/06/23	Aguardando orientação e deliberação do GAPE

Cronograma - atualização

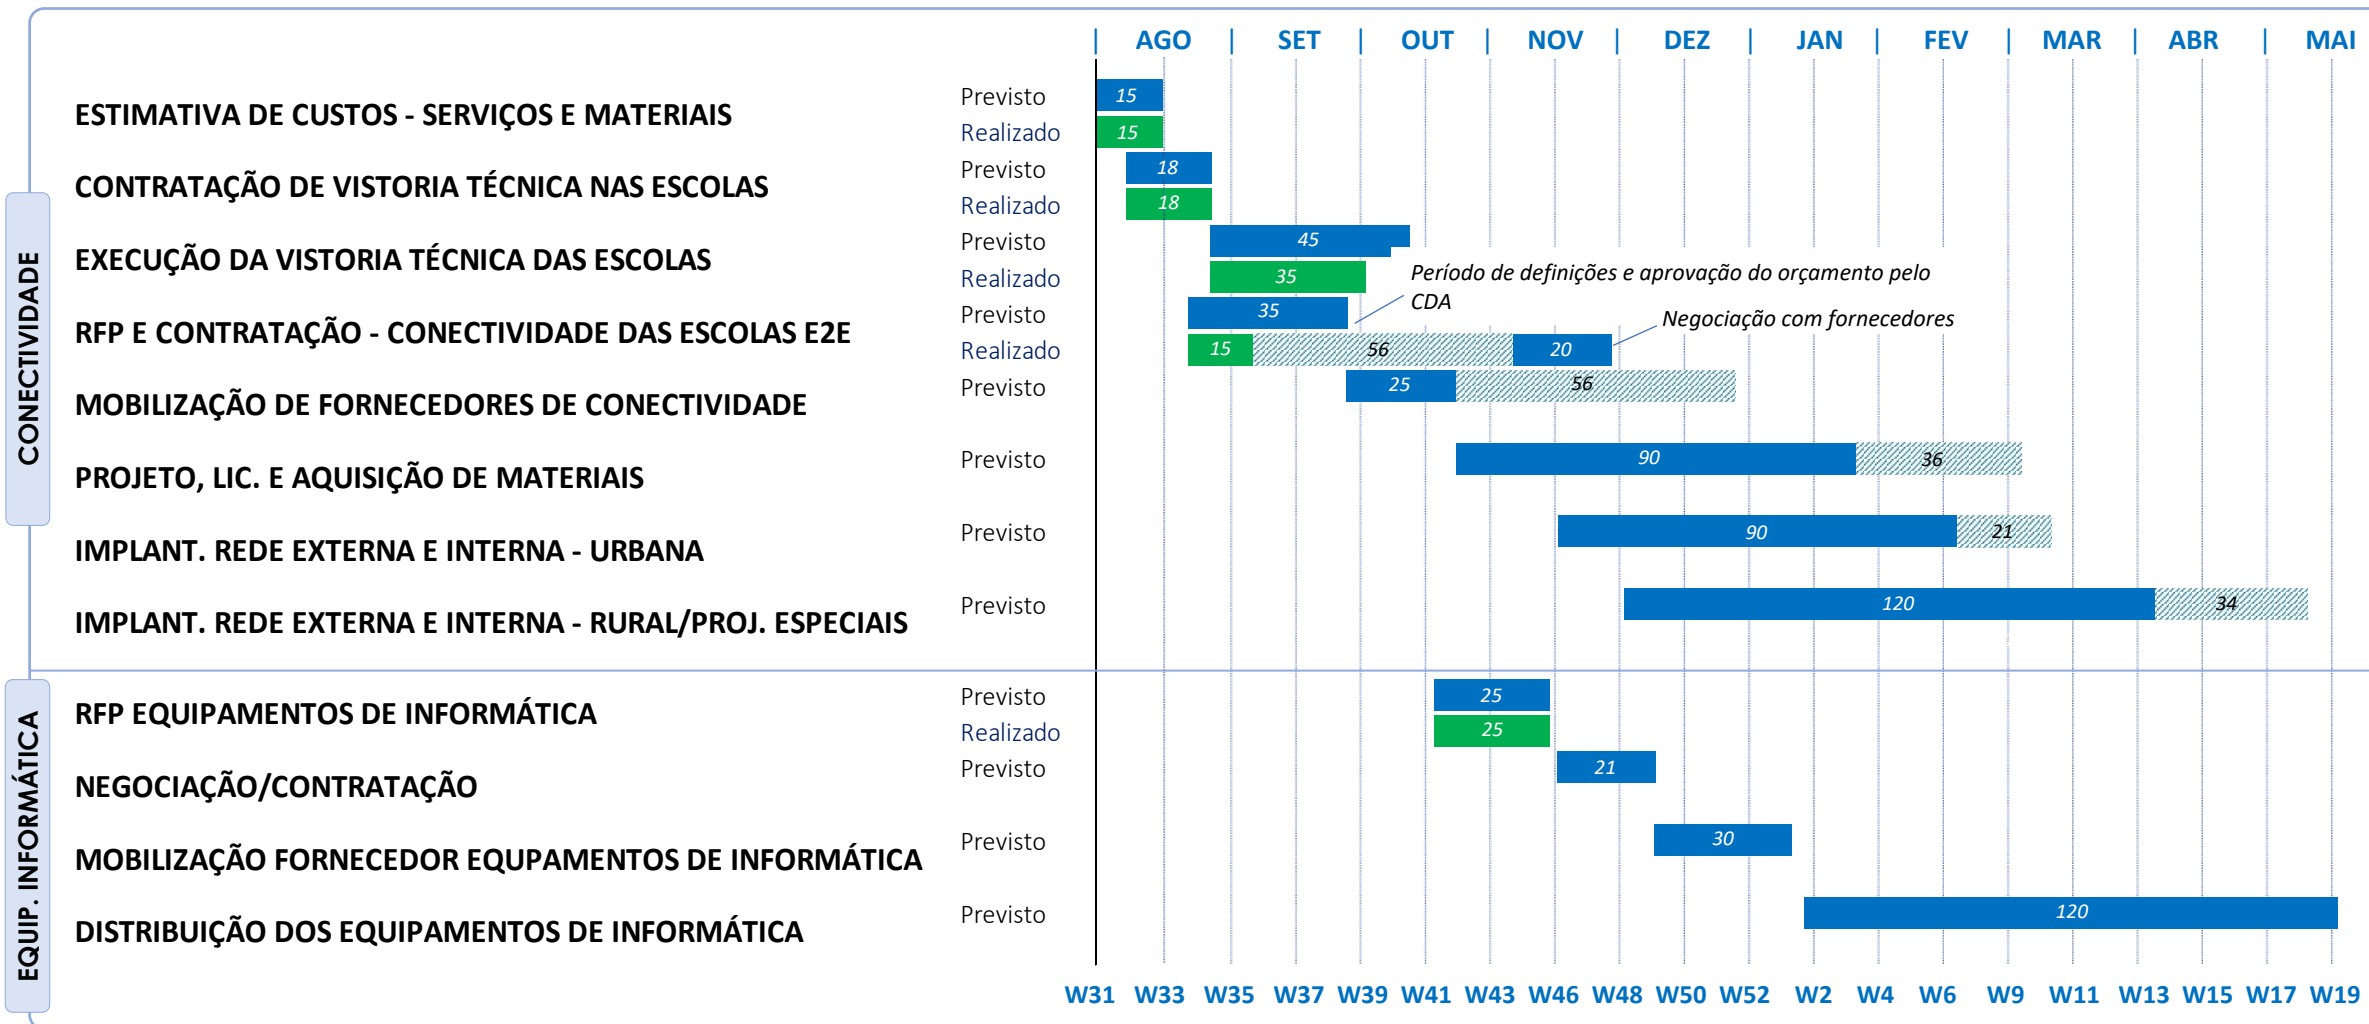

█ O tempo de execução das atividades se mantém. A EACE tem o desafio de mitigar o impacto decorrente do período de definições dos equipamentos de informática e aprovação do Projeto-Piloto pelo Conselho Diretor Anatel.

Obrigado!
